Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Validación y formalización del análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Fecha: 27/Marzo /2026

Hora: 4:30 pm – 5:30 pm

MINUTA No. 19

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez			
Propósito de la reunión:	Revisar, validar y formalizar el análisis de las 5 Fuerzas de Porter como parte de la documentación del proyecto.			
Asistentes:	Kenneth Tavares	Jared Martínez	Carlos Manuel Corona Ramirez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:	Fortalezas de Porter			
Adjuntos:	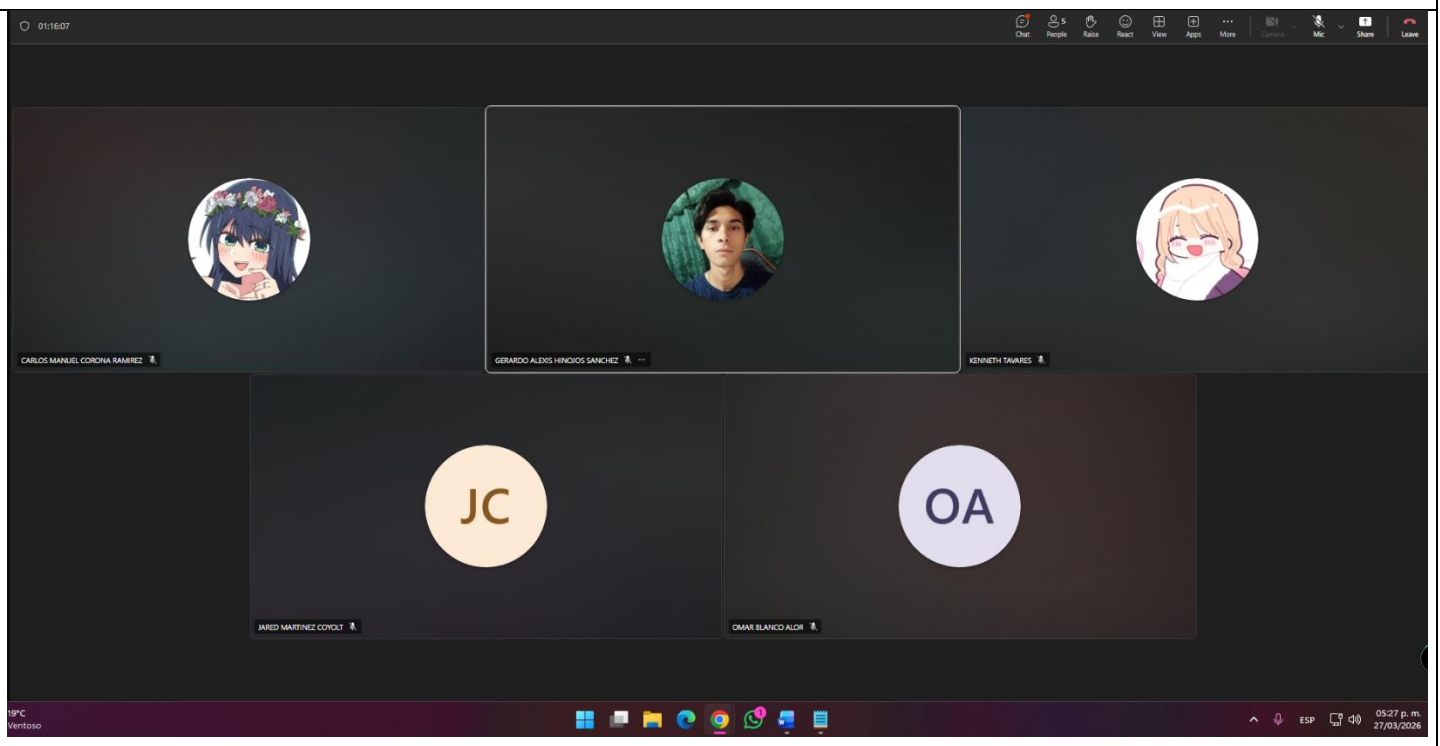			

Puntos Claves Discutidos:

1	**Cálculo de tiempos PERT:** Se aplicó la fórmula correspondiente utilizando las estimaciones (O, M, P) para obtener la duración esperada de cada actividad.
2	**Revisión de duración del proyecto:** Se sumaron los tiempos para evaluar si la duración total estimada se alinea con la fecha de entrega acordada.

Problemas:

1	**Duración excedida:** La primera proyección indicó que el tiempo total del proyecto sobrepasaba el plazo límite que se tenía contemplado.
2	**Errores de fórmula:** Se detectaron algunas discrepancias y errores de dedo al momento de aplicar la fórmula PERT en la hoja de cálculo.

Líneas de Acción:

1	**Revisión de paralelismo:** Analizar qué actividades pueden desarrollarse de manera simultánea para reducir el tiempo total del proyecto.
2	**Auditoría de cálculos:** Un integrante distinto al que capturó los datos se encargará de auditar y corregir las fórmulas en el documento de estimaciones.
