Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Estimación de tiempos del proyecto (optimista, probable y pesimista)

Fecha: 28/Marzo /2026

Hora: 4:30 pm – 5:30 pm

MINUTA No. 20

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez			
Propósito de la reunión:	Estimar los tiempos del proyecto mediante la definición de escenarios optimista, probable y pesimista para cada actividad.			
Asistentes:	Kenneth Tavares	Jared Martínez	Carlos Manuel Corona Ramirez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:				
Adjuntos:	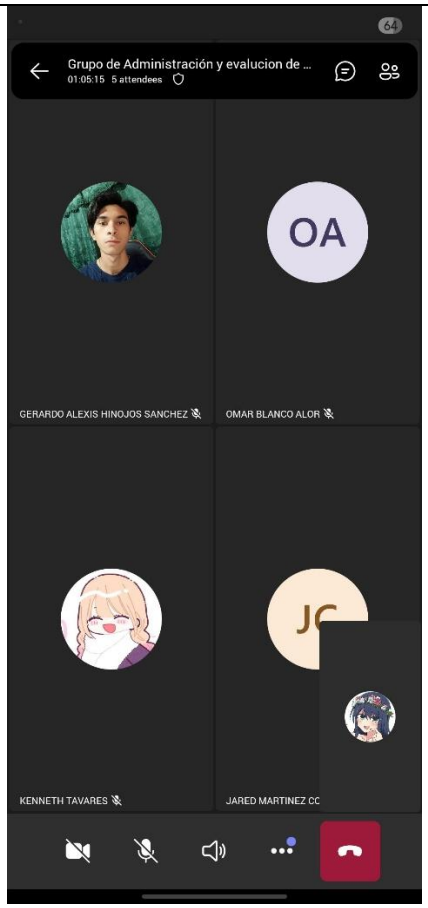			

Puntos Claves Discutidos:

1	**Definición de predecesores y secuencia lógica:** Se analizó qué tareas deben completarse obligatoriamente antes de poder iniciar las siguientes.
2	**Identificación de flujo del proyecto:** Se trazó el camino general de las actividades, sentando las bases para identificar la ruta crítica.

Problemas:

1	**Dependencias confusas:** Hubo confusión al determinar si algunas tareas de documentación dependían del desarrollo terminado o si podían avanzarse a la par.
2	**Cuellos de botella:** Nos dimos cuenta de que muchas actividades posteriores dependen exclusivamente de una sola tarea crítica (como la estructura de la base de datos).

Líneas de Acción:

1	**Borrador visual:** Crear un diagrama de red rápido a mano o en pizarra virtual para visualizar claramente las dependencias antes de pasarlo al software.
2	**Priorización:** Asignar mayor prioridad y revisión a las tareas que fungen como cuello de botella para evitar que retrasen a todo el equipo
