Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Cálculo de tiempos esperados y duración del proyecto (PERT)

Fecha: 04/Abril /2026

Hora: 4:30 pm – 5:30 pm

MINUTA No. 21

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez			
Propósito de la reunión:	Calcular los tiempos esperados del proyecto utilizando el método PERT y analizar la duración total estimada.			
Asistentes:	Kenneth Tavares	Jared Martínez	Carlos Manuel Corona Ramirez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:				
Adjuntos:	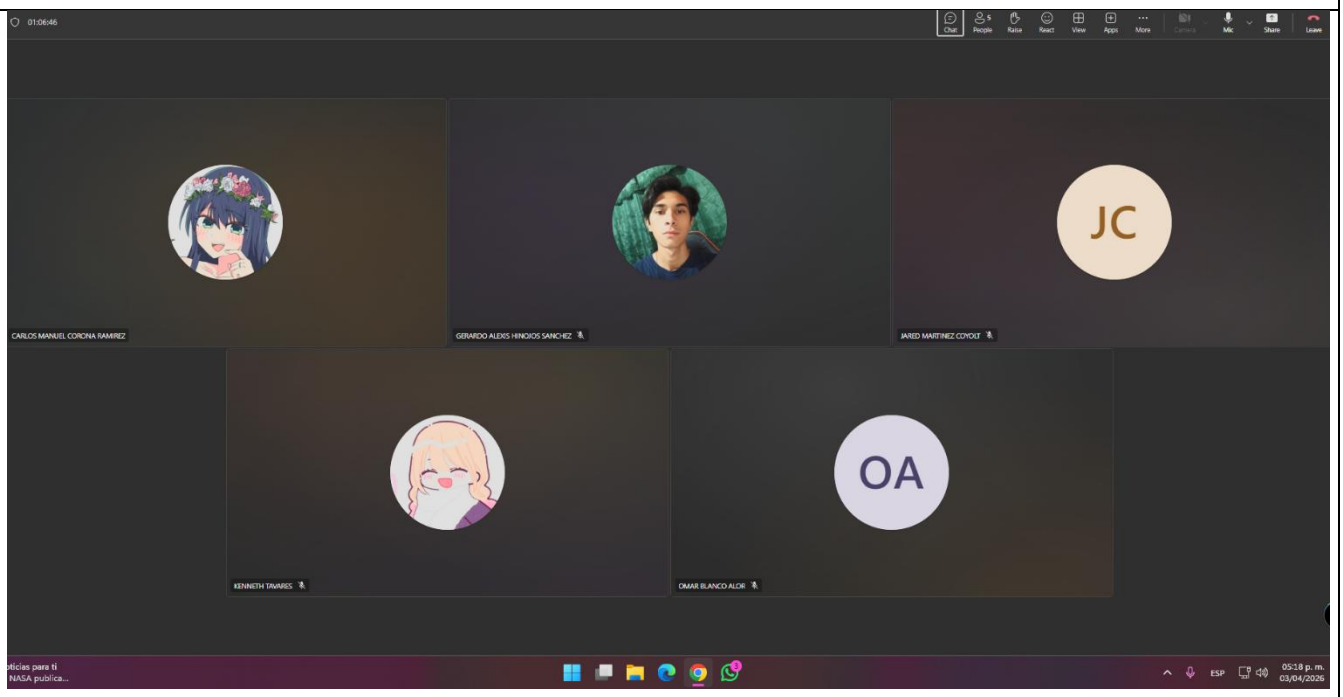			

Puntos Claves Discutidos:

1	**Configuración en ProjectLibre:** Se preparó el entorno de trabajo en la herramienta de gestión ProjectLibre.
2	**Carga de actividades y tiempos:** Se vació la información del WBS, los tiempos PERT calculados y las dependencias lógicas dentro del software para generar el diagrama de Gantt.

Problemas:

1	**Curva de aprendizaje:** Algunos miembros del equipo no estaban familiarizados con la interfaz de ProjectLibre, lo que hizo que la captura de datos fuera un poco lenta.
2	**Desajuste de calendario:** El software estaba calculando fechas de entrega basándose en un calendario predeterminado, incluyendo fines de semana o días no laborables para el equipo.

Líneas de Acción:

1	**Mini-tutorial:** Compartir un recurso rápido o un video corto en el grupo para que todos entiendan las funciones básicas de ProjectLibre.
2	**Ajuste de calendario:** Configurar manualmente los días y horas laborables dentro de ProjectLibre para que el diagrama de Gantt refleje fechas de entrega reales y precisas.
