Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Elaboración de Red PERT, asignación de recursos y estimación de costos

Fecha: 27/Febrero /2026

Hora: 7:00 pm – 8:00 pm

MINUTA No. 12

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Kenneth Tavares			
Propósito de la reunión:	Elaboración de Red PERT, asignación de recursos y estimación de costos			
Asistentes:	Carlos Manuel Corona Ramírez	Jared Martínez	Gerardo Alexis Hinojos Sánchez	Omar Blanco
Documentos de la reunión:				
Adjuntos:	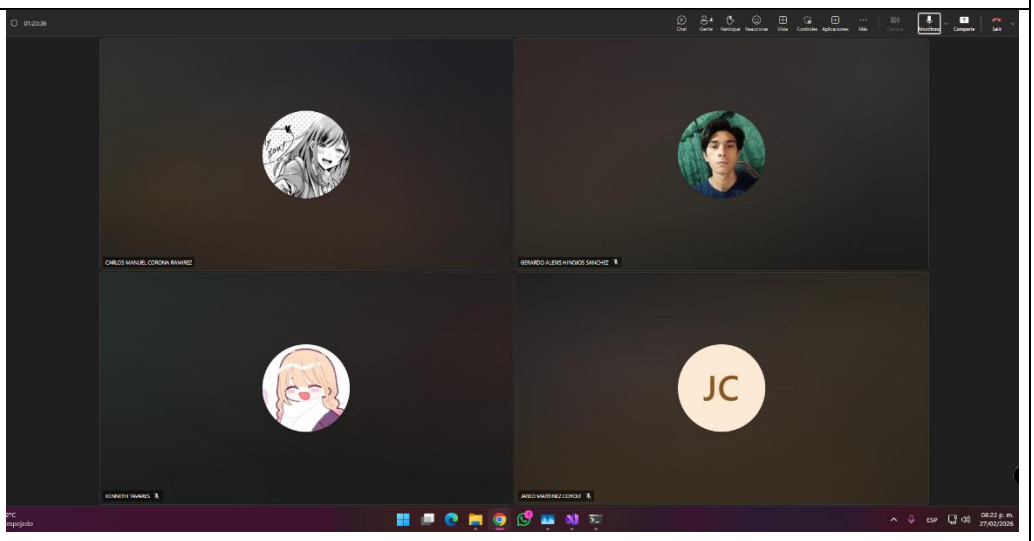			

Puntos Claves Discutidos:

1	**Desarrollo de la Red PERT:** Se identificaron las actividades necesarias para la Fase 2 del proyecto. Se establecieron las relaciones de precedencia entre tareas. Se definieron tiempos estimados para cada actividad con el fin de calcular la ruta crítica.

2	**Asignación de recursos:** Se determinaron los recursos humanos involucrados en cada actividad según los roles previamente definidos.
3	**Estimación de costos:** Se realizó un cálculo aproximado de costos basado en el tiempo estimado de trabajo por rol. Se analizaron costos asociados a herramientas tecnológicas y posibles gastos adicionales.

Problemas:

1	**Dificultad en la estimación de tiempos:** Se presentó incertidumbre al estimar la duración de algunas actividades debido a la falta de experiencia previa en proyectos similares.
2	**Asignación equilibrada de recursos:** Fue necesario ajustar la distribución de tareas para evitar sobrecarga en ciertos integrantes del equipo.
3	**Cálculo aproximado de costos:** Algunos costos fueron estimados de manera general debido a que no todos los gastos están completamente definidos.

Líneas de Acción:

1	**Revisar y ajustar la Red PERT:** Validar la secuencia de actividades y confirmar la ruta crítica del proyecto.
2	**Monitorear el uso de recursos:** Dar seguimiento continuo a la asignación de tareas para mantener equilibrio en la carga de trabajo.
3	**Actualizar estimaciones de costos:** Refinar los cálculos conforme avance el proyecto y se tenga información más precisa.
